

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年6月13日

計画の名称	安全安心な公園等が身近にあるまちづくり																				
計画の期間	平成24年度～平成25年度 (2年間)			交付対象	栄町																
計画の目標	町内の既存公園について、適正な管理を行い誰もが利用できる安全安心な公園等を増やし、防災に寄与する公園の整備を検討し、災害時にも安全安心なまちづくりを推進します。																				
計画の成果目標 (定量的指標)	町が管理するすべての都市公園 (40公園) の公園施設長寿命化計画を策定する。 緊急性の高い安全の確保されていない公園施設を修繕し、利便性高い安心安全な公園を整備する。																				
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">①長寿命化計画策定済みの都市公園率</td> <td>当初現況値</td> <td>中間目標値</td> <td>最終目標値</td> <td rowspan="2">備考</td> </tr> <tr> <td>(H25当初)</td> <td>(H25中間)</td> <td>(H25末)</td> </tr> <tr> <td>②公園施設の修繕された公園数</td> <td>0公園</td> <td></td> <td>5公園</td> <td></td> </tr> </table>								①長寿命化計画策定済みの都市公園率	当初現況値	中間目標値	最終目標値	備考	(H25当初)	(H25中間)	(H25末)	②公園施設の修繕された公園数	0公園		5公園	
①長寿命化計画策定済みの都市公園率	当初現況値	中間目標値	最終目標値	備考																	
	(H25当初)	(H25中間)	(H25末)																		
②公園施設の修繕された公園数	0公園		5公園																		
全体事業費	合計 (A+B+C)	155百万円	A	152百万円	B	0百万円	C	3百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	1.9%											

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
	本町建設課において実施	平成28年度
		公表の方法
		町ホームページにより公表

1. 交付対象事業の進捗状況


交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
1-A-1	公園	一般	栄町	直接	栄町	栄町公園施設長寿命化計画策定事業	公園施設長寿命化計画策定40公園	栄町						12	
1-A-2	公園	一般	栄町	直接	栄町	栄町都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	改築・更新 (5公園)	栄町						140	
合計													152		
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
1-C-1	公園	一般	栄町	直接	栄町	栄町公園再整備計画策定事業	公園再整備計画策定40公園	栄町						3	
合計													3		
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			
	1-A-1と同時に計画作成することにより、公園施設の適正な管理を行い、地域の実状に合わせた福祉、健康、防災に配慮した安全安心な公園整備が可能となる。														

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		公園施設の長寿命化計画を策定したことにより、今後の各施設の整備(撤去・更新・補修等)をしていく優先順位等が、健全度の観点から明確になった。			
II 定量的指標の達成状況	指標① 長寿命化計画策定済みの 都市公園率	最終目標値	100.0%	目標値と実績値に差が出た要因	1公園(矢口神明広場)には、主要な建物や工作物が設置されておらず、現存しているフェンスや植栽等についても、日常的な維持保全の中で対応することとしたため、長寿命化計画の対象公園から除外しました。
		最終実績値	97.5%		
	指標② 公園施設の修繕された公園数	最終目標値	5	目標値と実績値に差が出た要因	最終実績値の1公園については、水と緑の運動広場の修繕を行いました。水と緑の運動広場は、町民全般の休息、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的に建設された総合的な役割の公園です。この公園の修繕を優先順位1番とし、修繕必要箇所(大型複合遊具改修、野球場改修、テニスコート改修、トイレ改修)の改修を行った為、他4公園(街区公園)については、修繕の実施ができませんでした。
		最終実績値	1		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項(今後の方針等)					
<p>今後は、公園施設長寿命化計画に基づき施設の維持・修繕・更新を効率的かつ効果的に実施していく。</p>					

(参考図面) 市街地整備

計画の名称	1 安全安心な公園等が身近にあるまちづくり	交付対象	栄町
計画の期間	平成24年度 ~ 平成25年度 (2年間)		

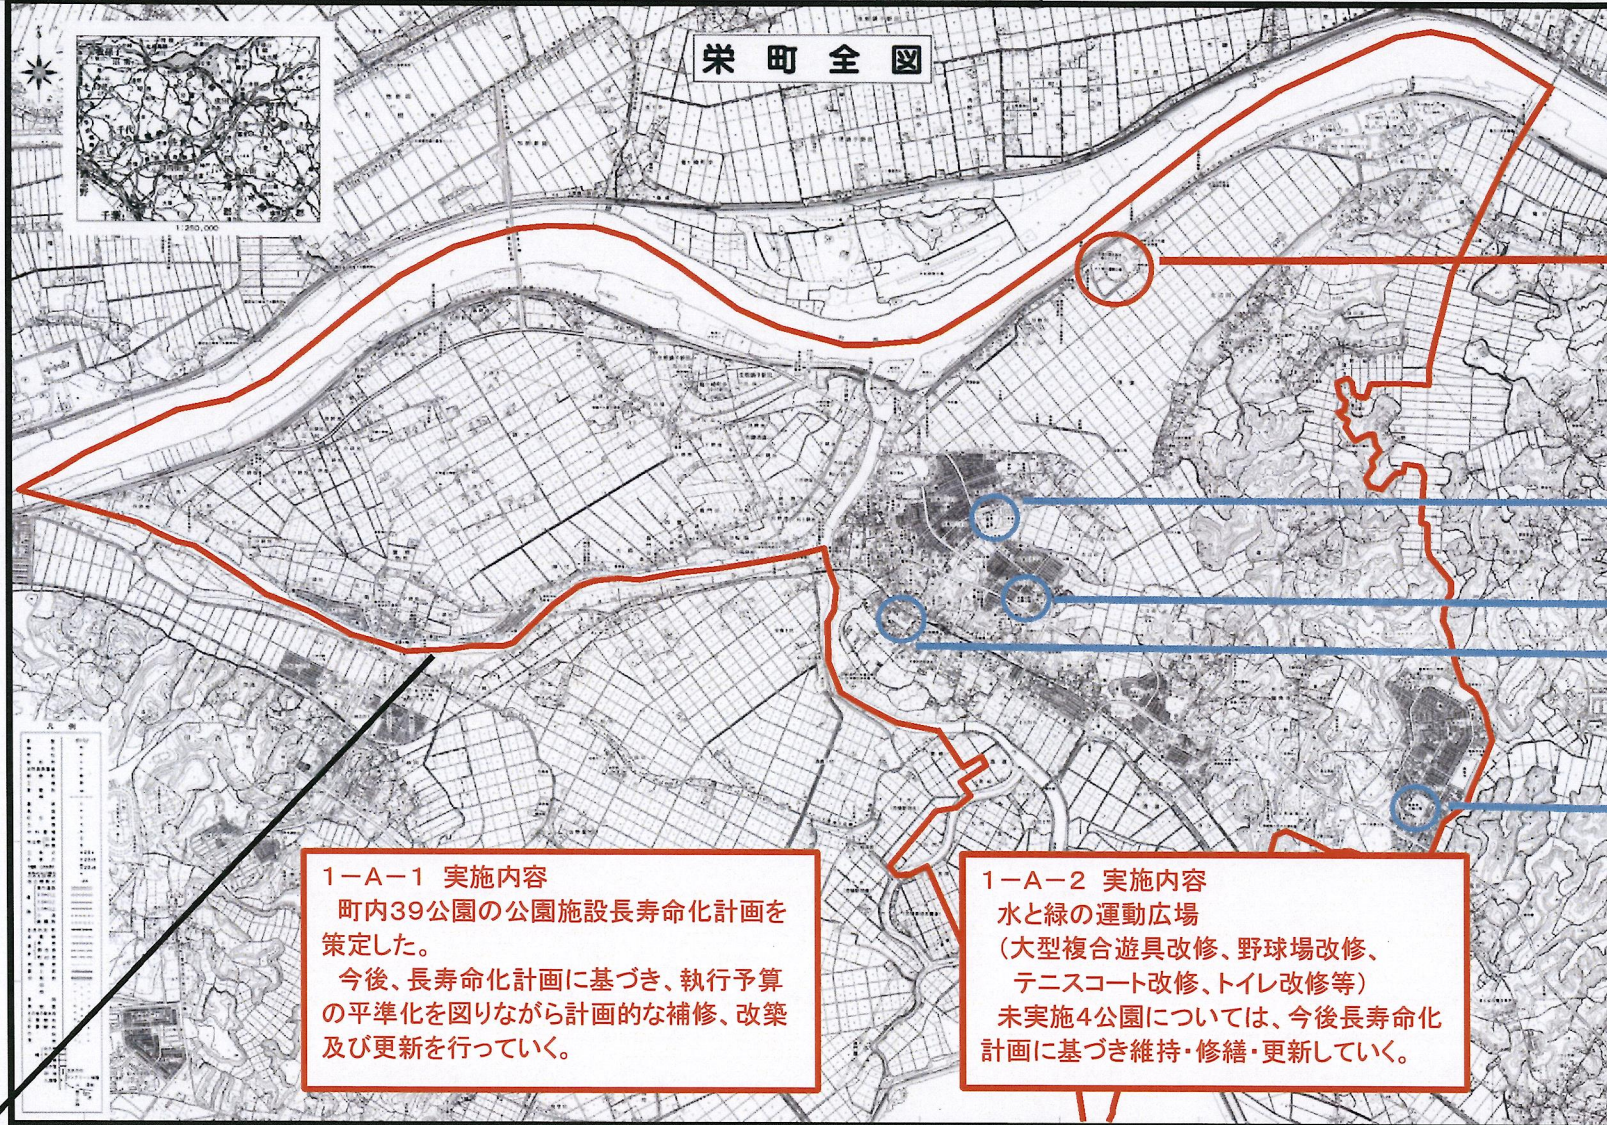

水と緑の運動広場  
(都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業)

安食台第一近隣公園  
(都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業)

安食台第二近隣公園  
(都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業)

前新田第一児童公園  
(都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業)

彦角寺近隣公園  
(都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業)

**1-A-1 実施内容**  
町内39公園の公園施設長寿命化計画を策定した。  
今後、長寿命化計画に基づき、執行予算の平準化を図りながら計画的な補修、改築及び更新を行っていく。

**1-A-2 実施内容**  
水と緑の運動広場  
(大型複合遊具改修、野球場改修、テニスコート改修、トイレ改修等)  
未実施4公園については、今後長寿命化計画に基づき維持・修繕・更新していく。

1-A-1	栄町公園施設長寿命化計画策定事業(町全域)	
公園規模	公園数	内 訳
小規模公園	35	街区公園34 近隣公園1
中規模公園	3	近隣公園公園2 都市緑地公園1
大規模公園	1	地区公園1
計	39	

1-A-2	栄町都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業計画	
公園規模	公園数	内 訳
小規模公園	0	街区公園0 近隣公園0
中規模公園	0	近隣公園0
大規模公園	1	地区公園1
計	1	

1-C-1	効果促進事業(町全域)	
公園規模	公園数	内 訳
小規模公園	35	街区公園34 近隣公園1
中規模公園	3	近隣公園公園2 都市緑地公園1
大規模公園	1	地区公園1
計	39	
